



Det Digitale Sygehus

Et projekt i
Det Digitale Nordjylland

Det Digitale Sygehus

1. IT-Sundhed
2. Projektorganisation i Det Digitale Sygehus
3. Valg af EPJ-system
4. Positive erfaringer
5. Negative erfaringer
6. Hvad ville/kunne vi have gjort anderledes

Det Digitale Sygehus

et projekt i Det Digitale Nordjylland

Organisation IT-Sundhed

IT-Bestyrelse

Amstsundhedsdirektøren NJA
Sygehusdirektører i NJA
Planlægningschefen for NJA
IT-Sundhed (sekr)


IT-Koordinatorgruppen

IT-Sundhed
IT-koordinatorer fra alle sgh. i NJA
Embedsmænd fra NJA

IT-Sundhed

Det Digitale Sygehus

Projektorganisation

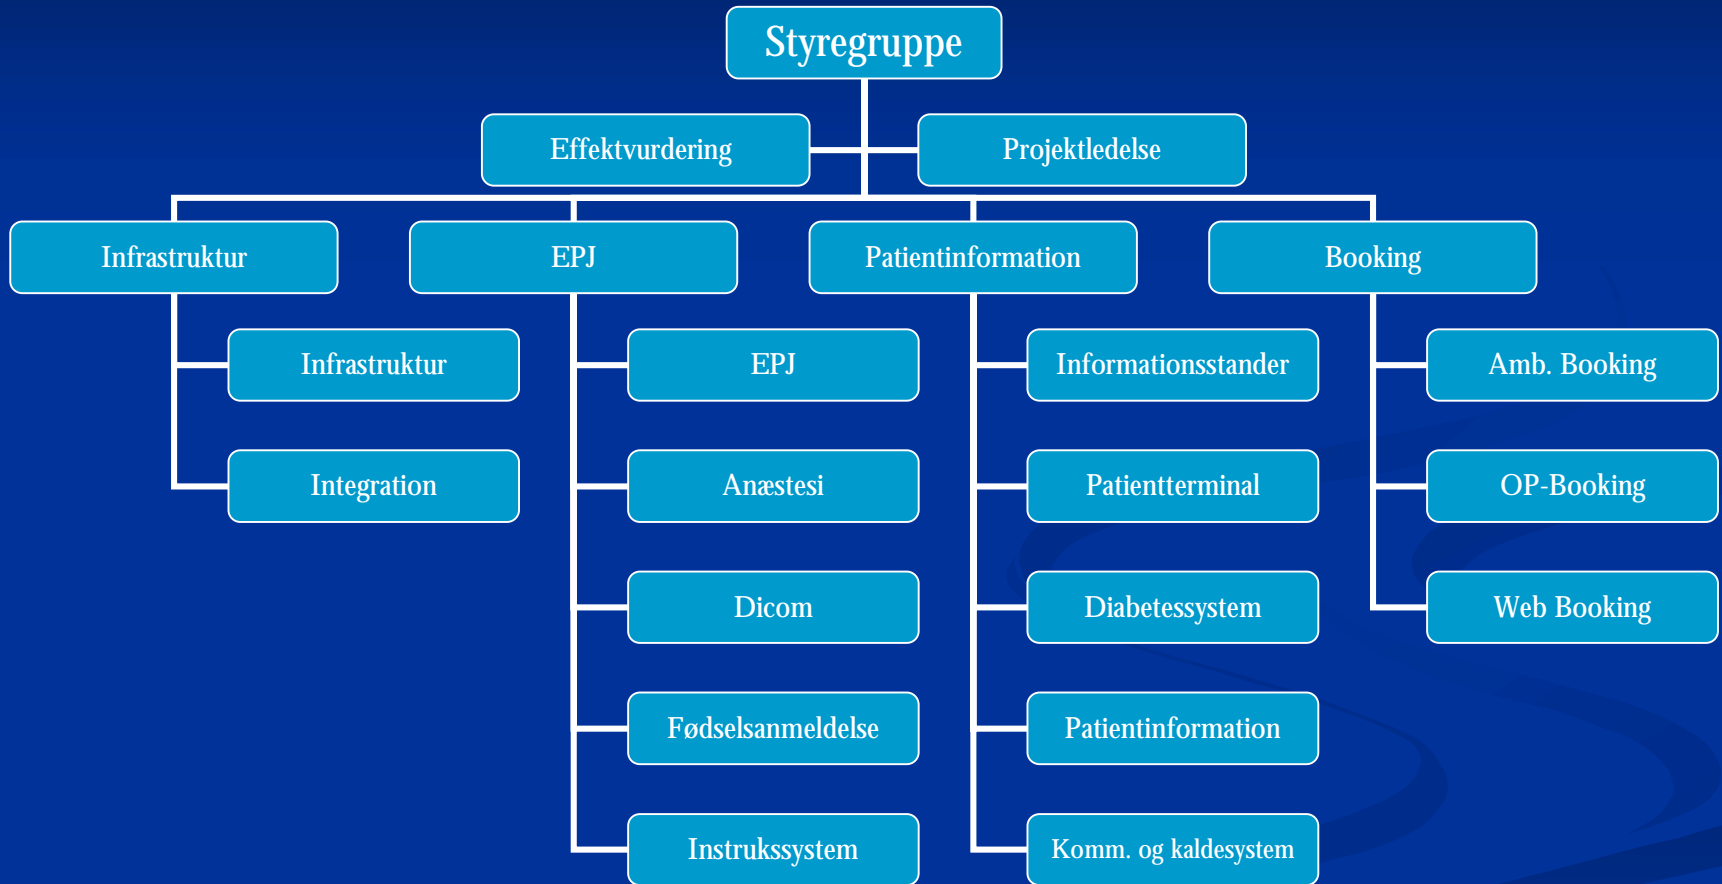

Det Digitale Sygehus

EPJ

Valg af system

Systemvalg:

Klinikere og IT-Sundhed i samarbejde

Systemleverandør:

IBM

Pilotdrift:

Thorax kir. Aalborg

Medicinsk Afdeling Hobro

Det Digitale Sygehus:

EPJ valgt ud fra ovennævnte kriterier samt tilbud fra leverandører

Det Digitale Sygehus

EPJ

Positiv erfaring

Projektorganisation

- Synlighed – tilstedeværelse
- Bemanding

Undervisning

- Grundlæggende edb

Information/Samarbejde

- Ledelsesplan
- Medarbejderplan
- Projektweb

Infrastruktur

- Trådløst netværk
- Hardware

Det Digitale Sygehus

EPJ

Negative erfaringer

Personaleressourcer

- Klinisk personale

Lægegruppen

- Engagement i projektet

Teknik/Økonomi

- Nødprocedurer / vagtberedskab

Det Digitale Sygehus

EPJ

Hvad ville vi have gjort anderledes

➤ Forventningsstyring

- Hvad er EPJ?
- Hvordan er integrationen med andre systemer?

➤ Afklaring af personaleforbrug

- Hvad er personaleforbruget til opsætning?
- Hvad er personaleforbruget til undervisning?
- Hvor lang tid forventes at gå, før ”produktionen” kører normalt igen?

➤ Studiebesøg/Foranalyse

- Afsætte flere midler (personale og økonomiske) til studiebesøg

Det Digitale Sygehus

www.detdigitalesygehus.dk
