

Hvorfor går det ikke (helt),  
som vi planlægger?

EPJ-observatoriets årsmøde

Den 26-27 oktober 2005

# Indførelse af Epj i Ringkjøbing Amt

Hans-Jørgen Frederiksen  
Klinisk EPJ-projektleder

# De første mål fra 2001

- Dokumentere procesorienteret behandling og pleje
- Udnytte eksterne hjælpe-/støttefunktioner
- Genbrug af data i alle relevante sammenhænge
- Brug af standardplaner baseret på kliniske instrukser
- Størst mulig automatik
- Leverer data til kliniske databaser, registre etc

# Mulige elementer i en EPJ

- Notatmodul (Klinisk Proces)
- Medicinmodul
- Rekvisition-svar
- Booking
- Billeddiagnostik
- Etc

# Historik

- Sundhedsudvalgets beslutning 2000
- Kontraktindgåelse forår 2001
  - ElektRA version 1 i pilotdrift i foråret 2002
- G-EPJ 2002
- Kontraktindgåelse forår 2003
  - ElektRA version 2 i drift oktober 2004

# Hvad har vi nu?

- En elektronisk patientjournal som består af et G-EPJ baseret (version 1.8) notatmodul (klinisk proces) og et medicinstyringssystem

# Status for udbredning af ElektRA

- 4. Oktober 2004 - Gynækologisk Afdeling
- 15. November 2004 - Obstetrikken
- 25. April 2005 - Psykiatrien
- 17. Maj 2005 - Børneafdelingen

# "Strategi" nu

- Sikre et velfungerende notatmodul og et enstrenget medicinsystem
- Fortsætte med udrulningen af ElektRA når ovenstående er sikret
- Sikre at medarbejderne kan arbejde med ElektRA og kompetence til at kunne håndtere en G-EPJ baseret journal
- Afvente udviklingen i regionen/nationen


# Historik

- Sundhedsudvalgets beslutning 2000
- Kontraktindgåelse forår 2001
  - ElektRA version 1 i pilotdrift i foråret 2002
- G-EPJ 2002
- Kontraktindgåelse forår 2003
  - ElektRA version 2 i drift oktober 2004


# Udfordringer

- Komplexitet
- Interesser
- Faglig autonomi
- Organisatorisk forankring
- Teknologisk udfordring
- Ledelse

# Omgivelserne

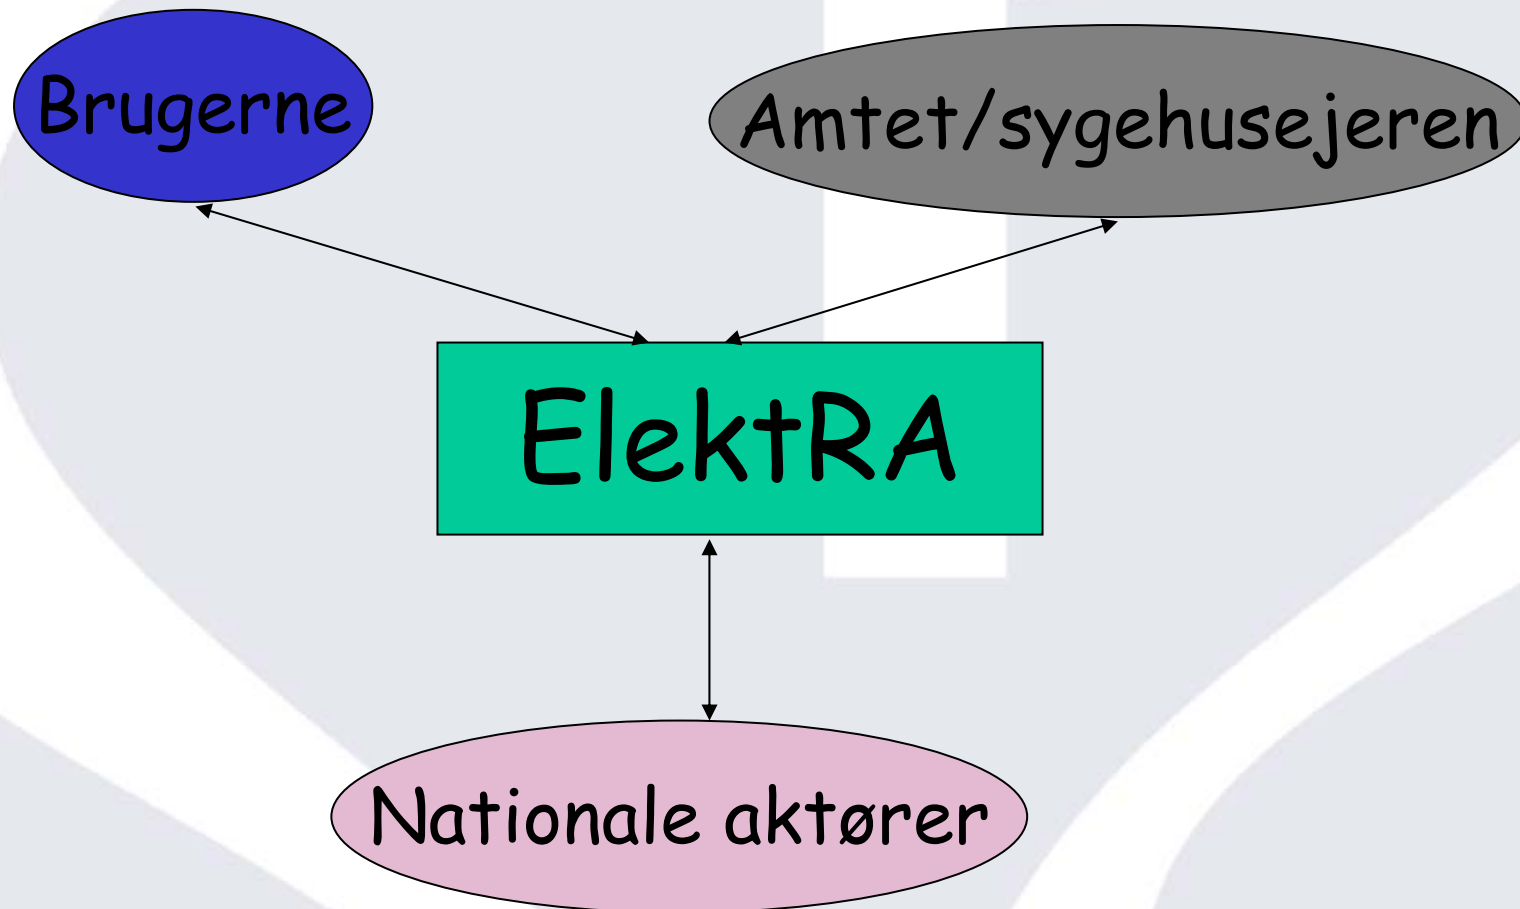

# Organisationen under forandring:

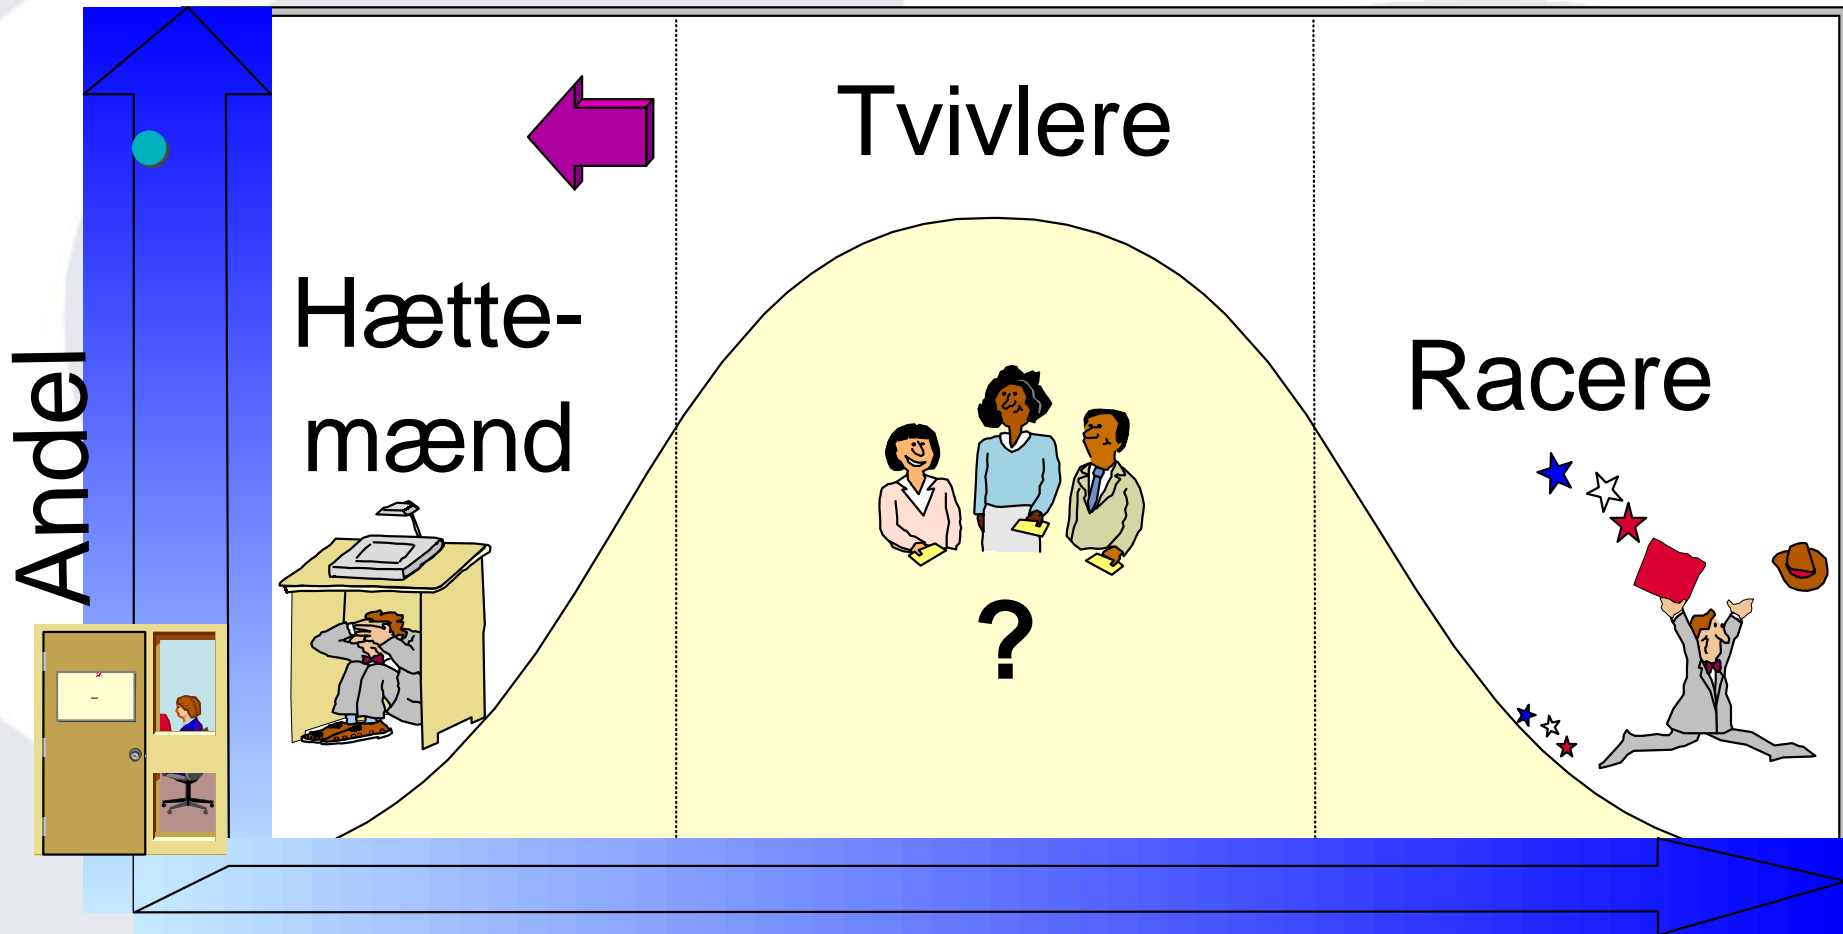

"De tre arketyper"

# Nationale aktører

- Amtsrådsforeningen og regeringen indgår aftale om at EPJ er indført med udgangen af 2005 eller snarest derefter
- Amtsrådsforeningen og regeringen indgår en aftale om at det danske sundhedsvæsen skal indgå en akkreditering med begyndelse i 2006
- Amtsrådsforeningen og regeringen indgår en aftale om takststyring af det danske sundhedsvæsen med start i 2005

# Historik

- Sundhedsudvalgets beslutning 2000
- Kontraktindgåelse forår 2001
  - ElektRA version 1 i pilotdrift i foråret 2002
- G-EPJ 2002
- Kontraktindgåelse forår 2003
  - ElektRA version 2 i drift oktober 2004

# ElektRA

- Udviklingen af et G-EPJ baseret notatmodul (klinisk proces) har været en udfordring
- Der har ikke været en facitliste
- Vi har ikke haft nogen at se over skulderen
- Vi har ikke set slutningen på udviklingen
- Brugerne har skullet lære at arbejde på en anderledes måde

# Sundhedsvæsenet

- Sundhedsvæsenet har en høj kompleksitet og en indbygget autonomi
- Et IT system som skal underbygge det kliniske arbejde i sundhedsvæsenet kan kun udvikles som en proces

# Konklusion

- ”Hvorfor går det ikke altid (helt) som vi har planlagt”
- Fordi en så kompliceret udviklingsproces, som udviklingen af ElektRa har været, ikke kan planlægges i detaljer.
